



附件一(A)

東亞交匯一號海纜系統 (EAC1) 區段 C 海纜故障維修作業範圍略圖

1. 故障地點：經初步量測判定故障點約位於台灣東部外海約 90 公里處，其位置為：23° 08.1026' N；122° 40.5820' E（水深約為 5,720 公尺）
2. 維修作業區域：詳如下列（作業範圍將於確定故障位置後縮小調整）
3. 作業期間：自民國 113 年 04 月 24 日起至民國 113 年 05 月 31 日止（實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及疫情狀況而調整）
4. 維修作業船舶：堅定號 (CS RESOLUTE)

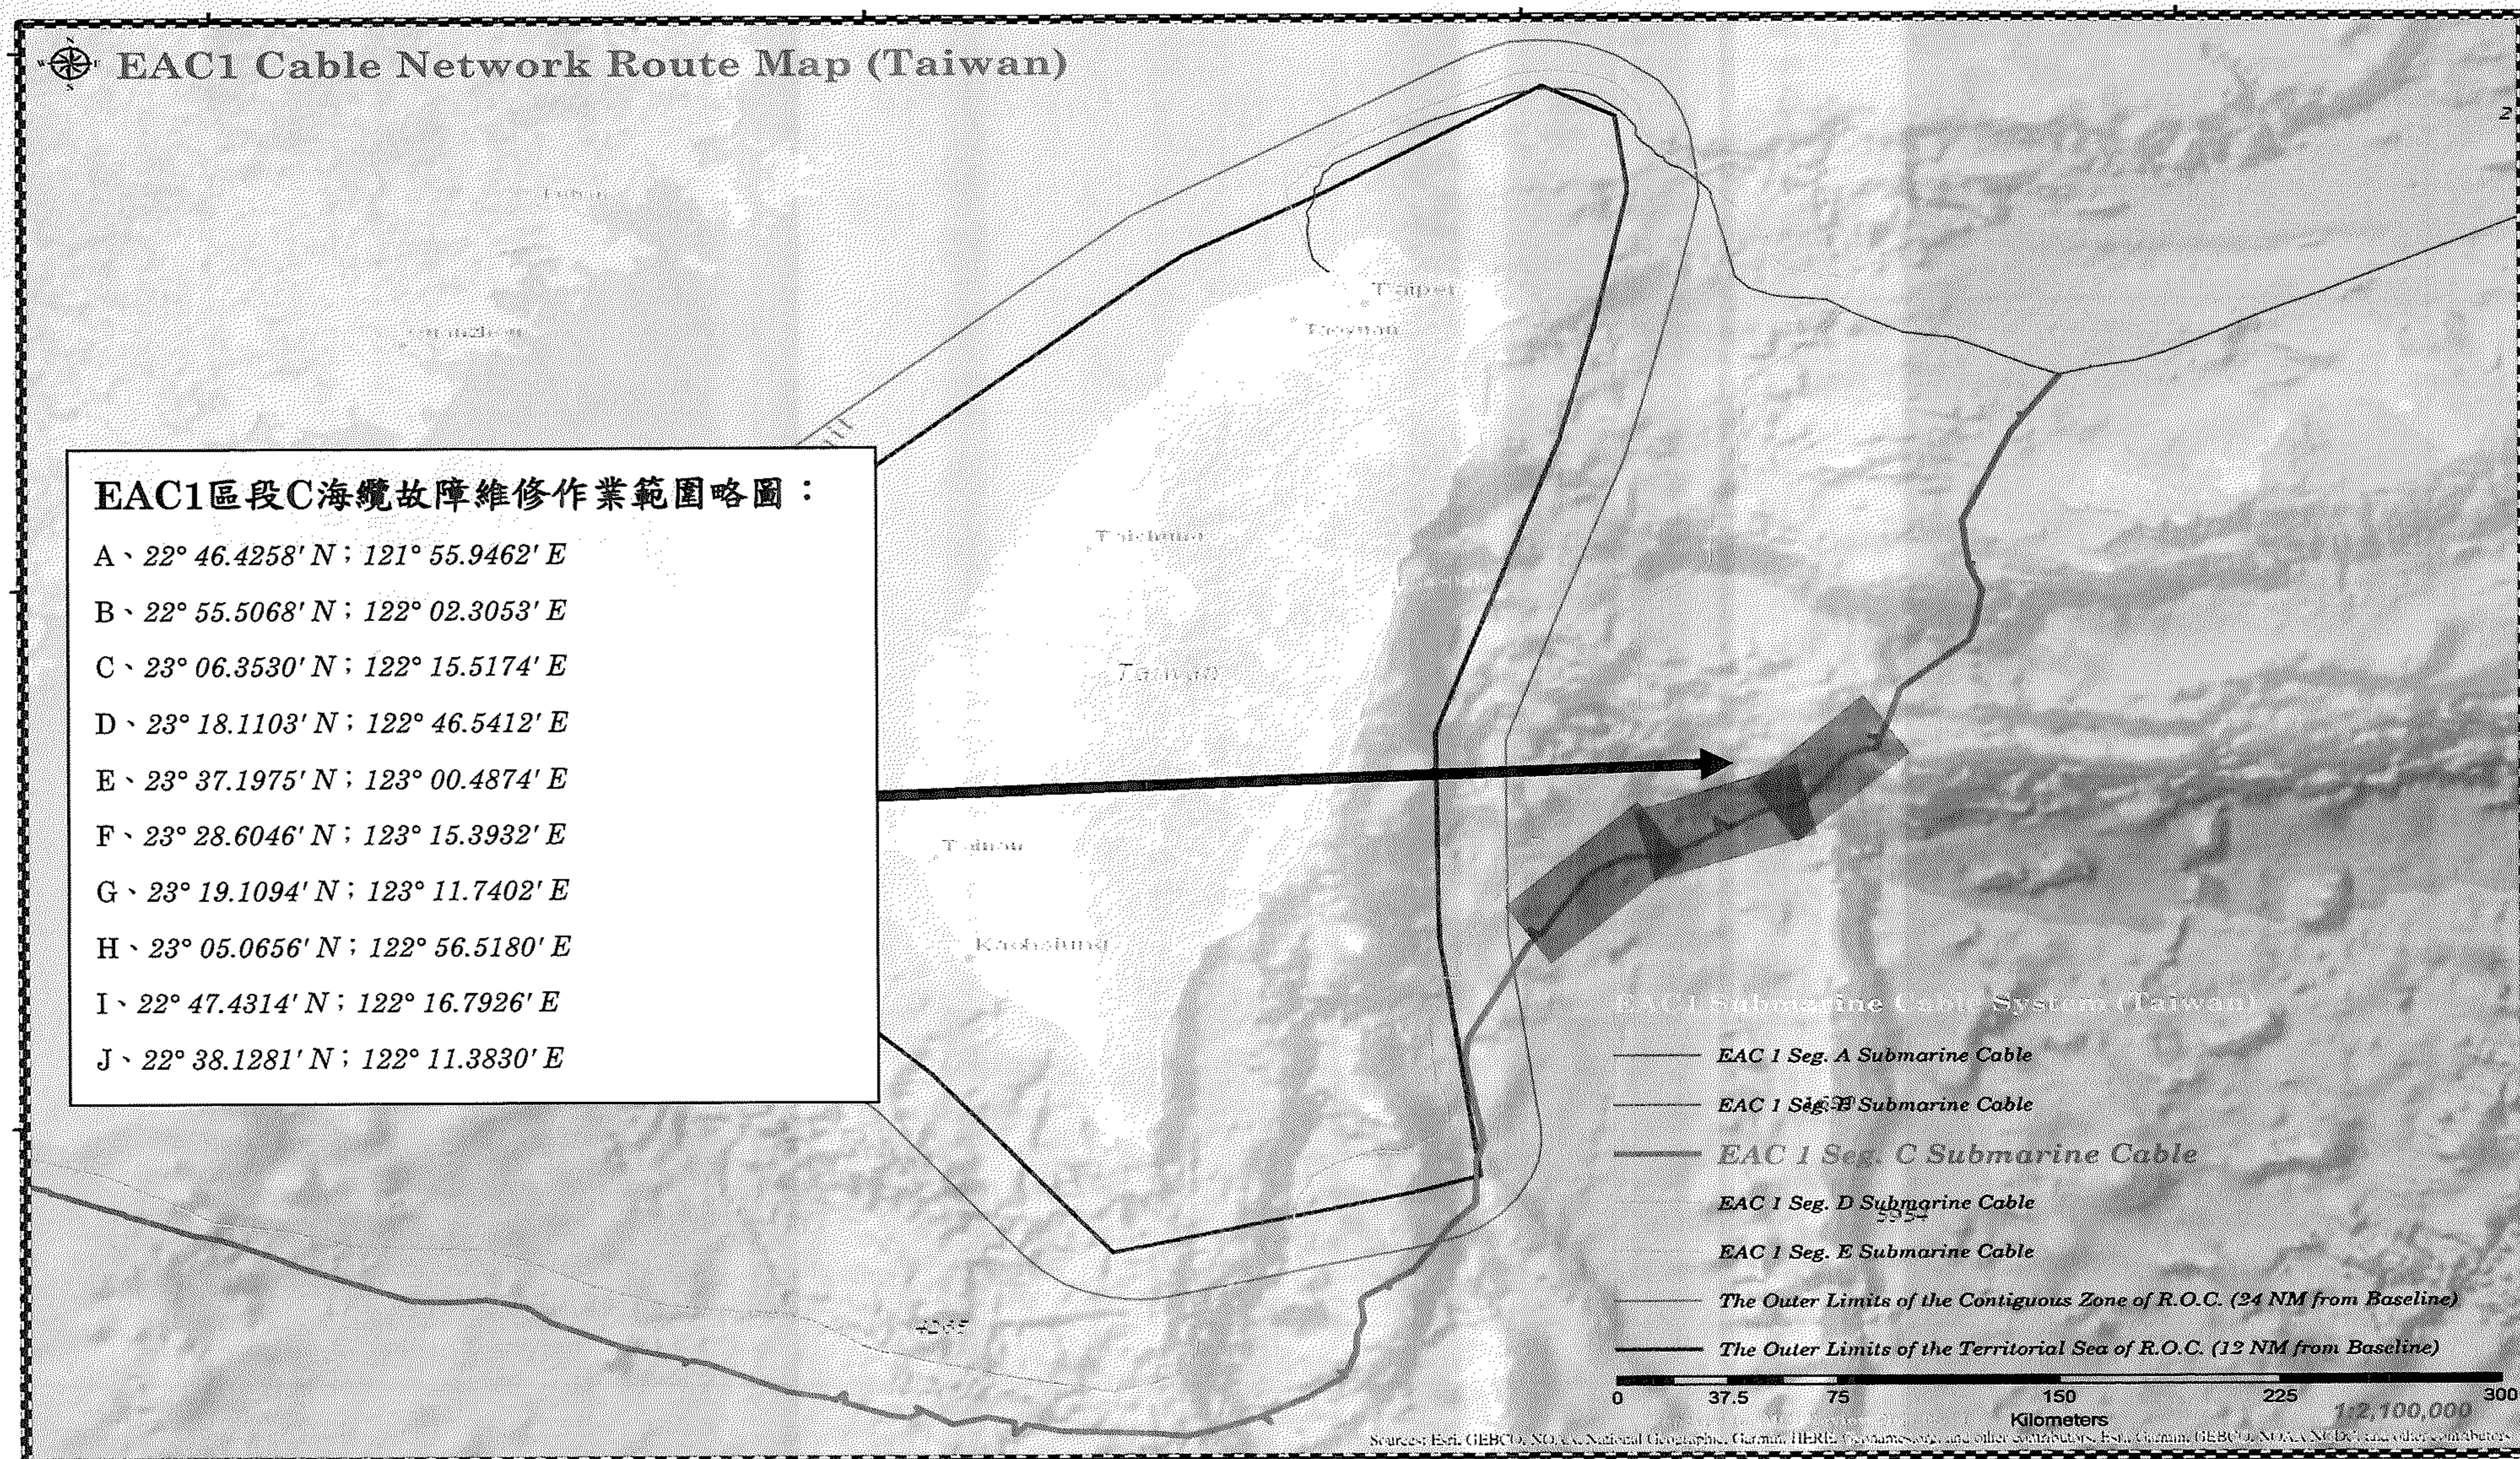

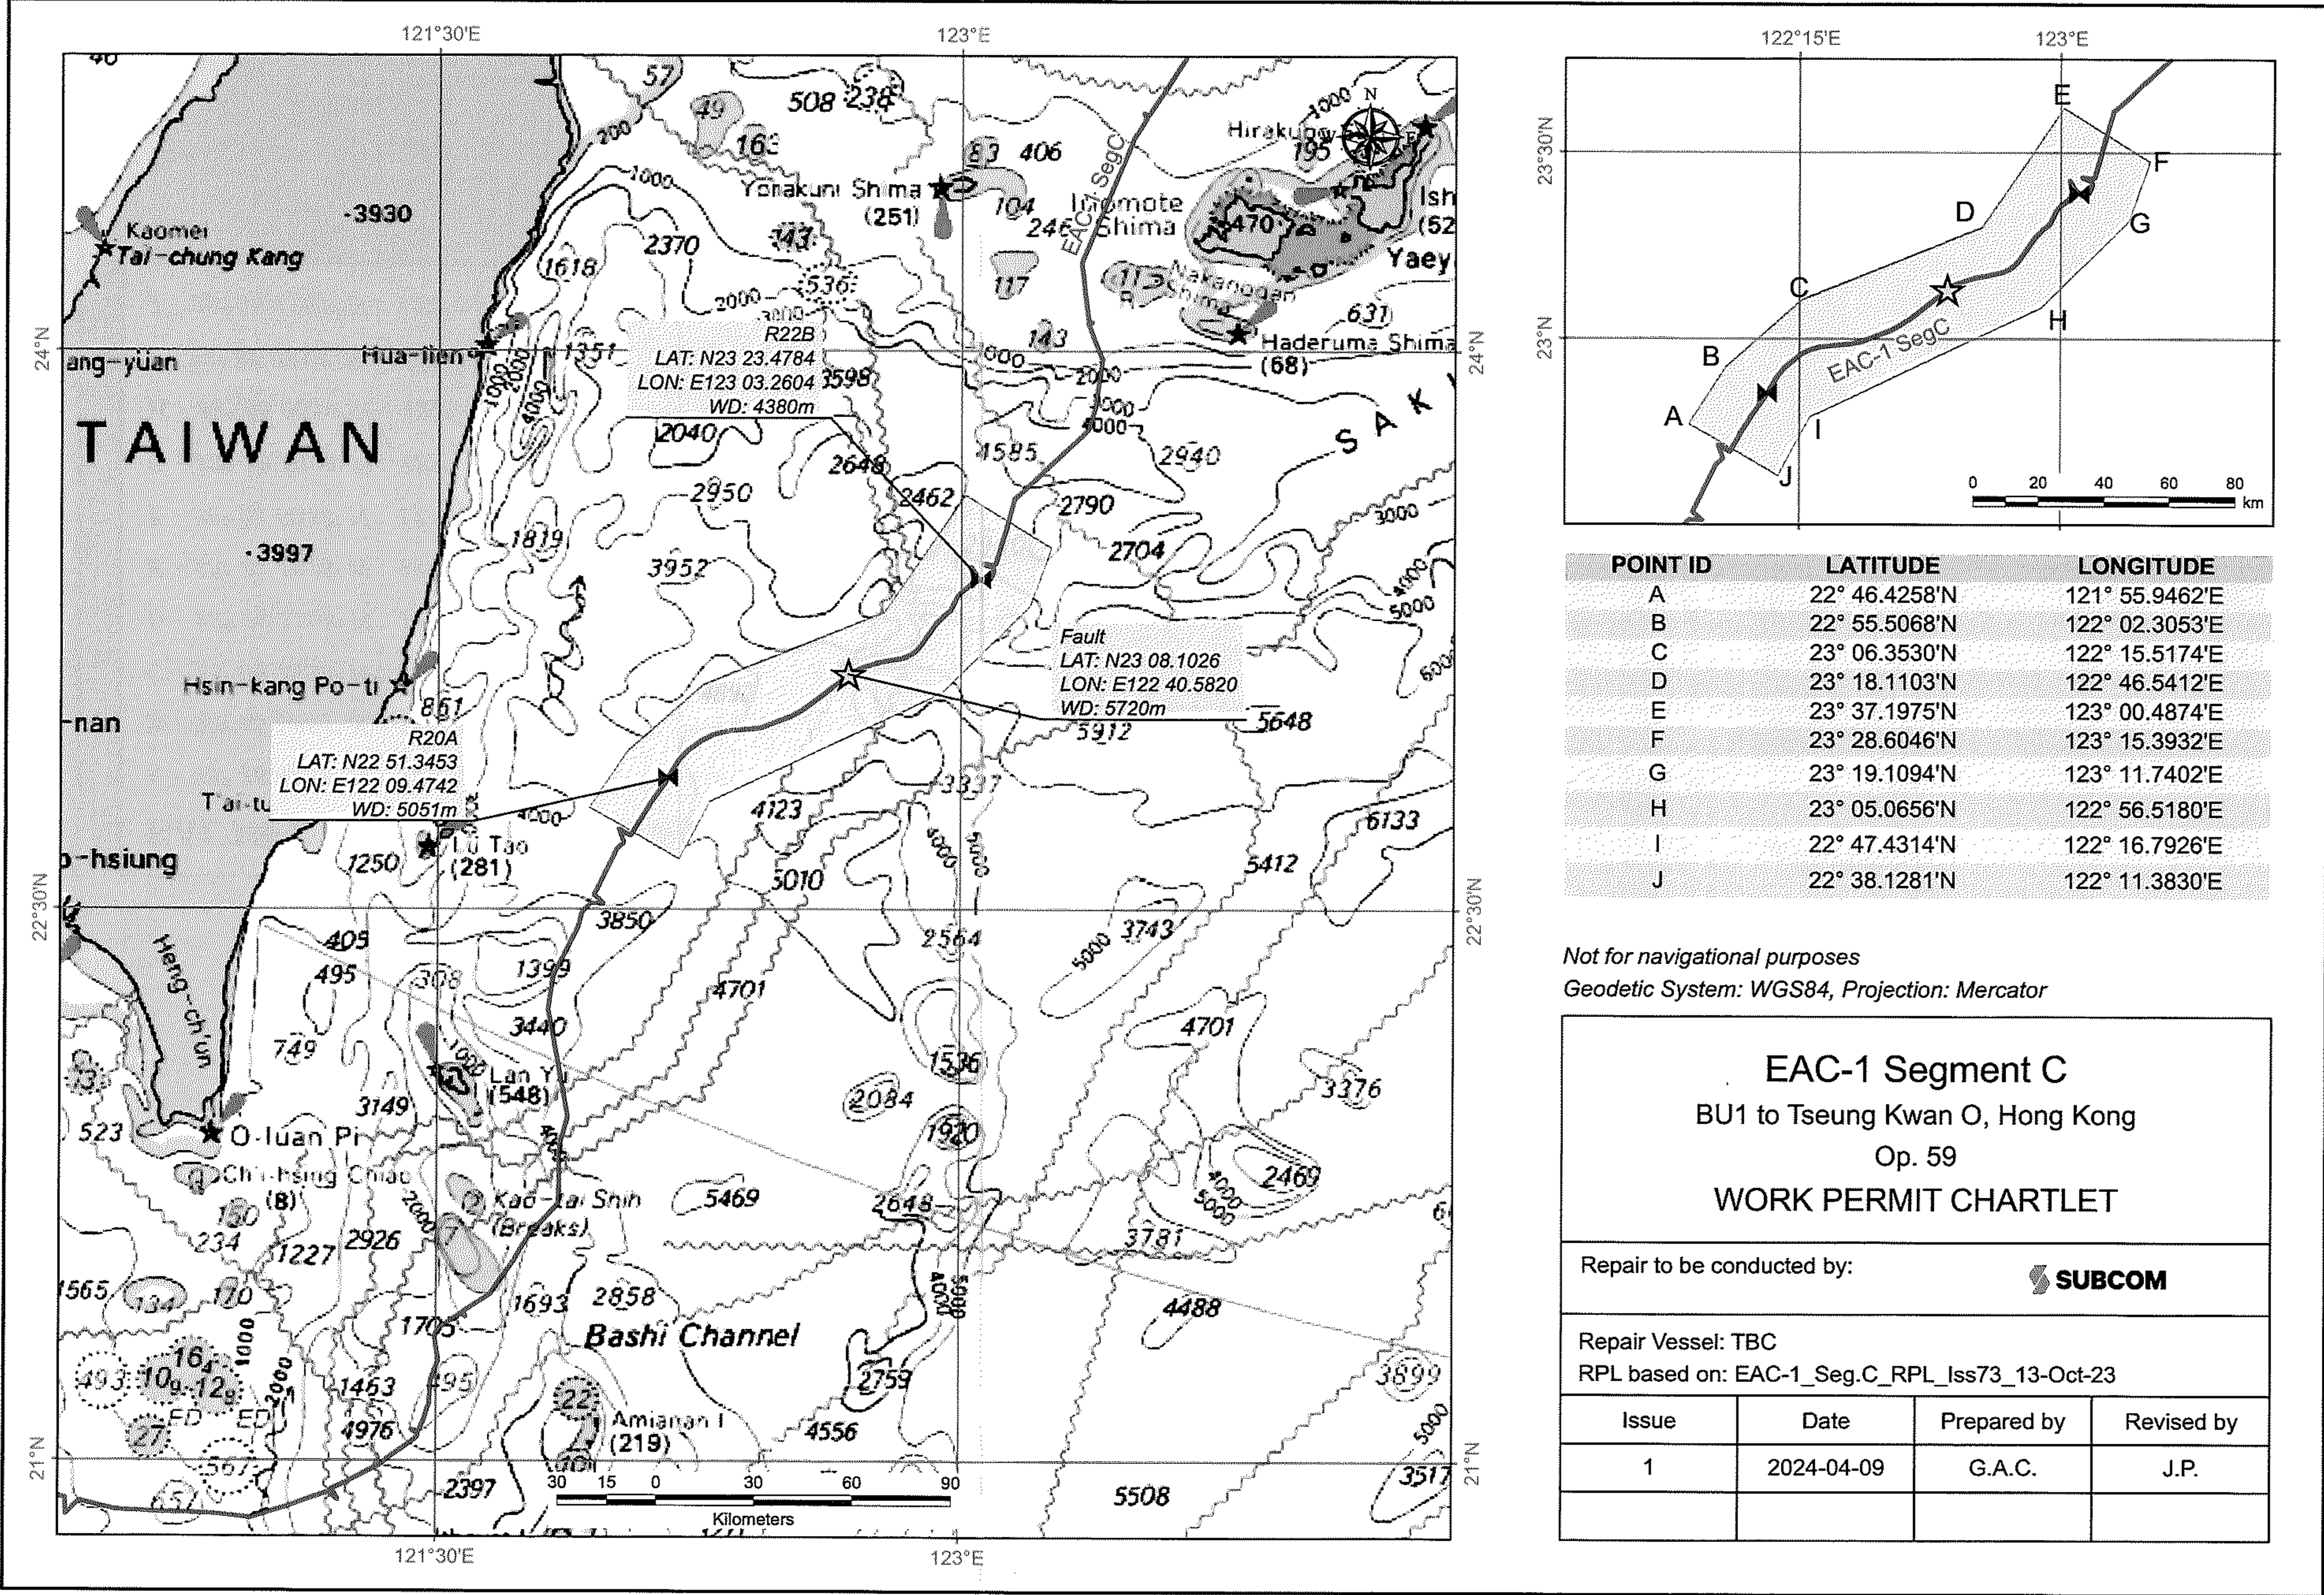

附件二：東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 C 故障搶修時間表（含時間、作業內容）

作業海域：台灣東部外海

作業船舶：堅定號（CS RESOLUTE）

編號	作業時間	作 業 內 容
1	2024/04/20 ~ 2024/04/28	APMMSA 前一趟於台灣海域維修作業。
2	2024/04/29	台中港內海纜維修作業前準備工作。
3	2024/04/30	前維修海域。
4	2024/05/01	到達維修海域；進行故障位置搜尋與確認工作；撈鉤與海纜切斷作業。
5	2024/05/02 ~ 2024/05/04	撈起第一端海纜；測試作業；確認海纜障礙位置；海纜末端處理、準備海纜初始接續作業。
6	2024/05/05	海纜初始接續與測試作業。
7	2024/05/06 2024/05/07	接續後海纜佈放作業；海纜末端處理、準備海纜最終接續作業。
8	2024/05/08 ~ 2024/05/09	海纜最終接續與測試作業。
9	2024/05/10 ~ 2024/05/11	維修後海纜重新佈放作業。
10	2024/05/12 ~ 2024/05/15	海事備用時間。
12	2024/05/16	離開維修海域；維修任務結束。

備註：

上列作業時間及作業內容供參考（實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及新冠肺炎疫情狀況而調整）

附件三：堅定號(CS RESOLUTE)海纜船船舶照片及規格資料

主要規格：140 m（長） 21 m（寬） 12.6 m（深） 12,184 ton（總噸位） 3,655 ton（淨噸位）

船 級：特殊儀裝佈纜船（Cable Ship） 國 籍：馬紹爾群島籍（Marshall Island）

AIS 系統：MMSI No. 538001923 & IMO No. 9242340 船 呼（Call Sign）：V7FF3

